

中央橋橋梁修繕工事（回覧板 4月末）


工事名 : 補道修第2-14号 橋梁修繕工事
場所 : 新潟県上越市浦川原区长走地内
工期 : R2年10月28日～R3年8月16日 完成R3年5月31日予定
(進捗率73%) 4月26日現在

受注者

 (株)郷土建設藤村組



本工事は、中央橋の補修と補強を行う工事です。

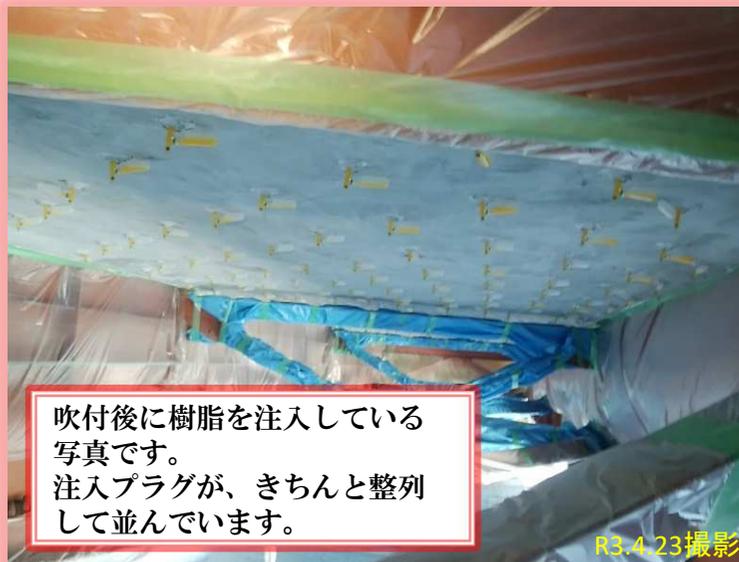

吹付後に樹脂を注入している
写真です。
注入プラグが、きちんと整列
して並んでいます。

R3.4.23撮影

4月の中旬には、橋の下面に補強材となる網状の鉄筋を設置しておりました。固定アンカーと樹脂注入アンカーという2種類のネジで全面に固定しました。吹付の準備として、橋の鋼材部分にブルーシートを貼りました。

4月の中旬から下旬にかけて、特殊なセメントを圧縮空気で吹き付けていました。22mmの厚さになるように2層に分けて吹付を行いました。この間、中央橋を片側交互通行規制にて施工を行っておりました。ご協力いただきありがとうございました。

～ 作業状況 ～

現在、予定通り進捗しています。ゴールデンウィーク前に吹付面の上塗りを行い、5月中旬より施工足場を取り外していき補修工事完了となります。足場の取り外しの際に、再び車両通行止め規制で施工させていただきますので、ご協力をお願いいたします。



現場担当の藤村です
